Garden Rapids at The Big Pool
08.1 Construction Contingency

Original amount	$ 225,965.88	
Final amount	$ 317,438.65	
Current Amount:	$ 271,385.56	$ 46,053.09
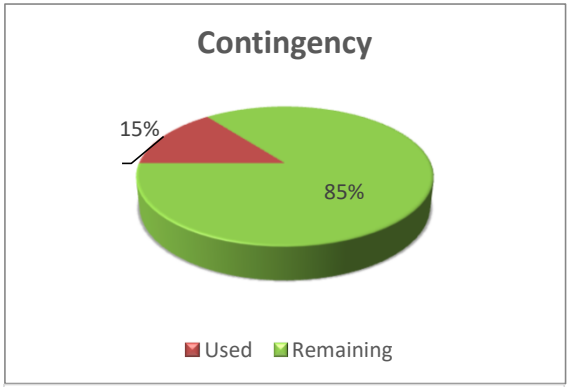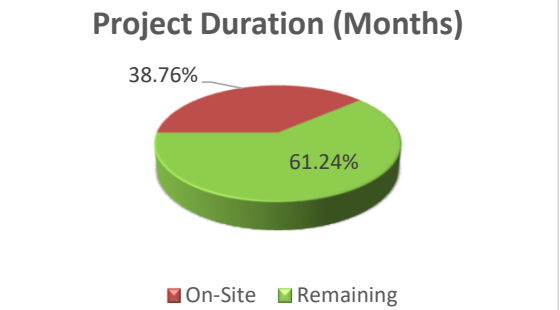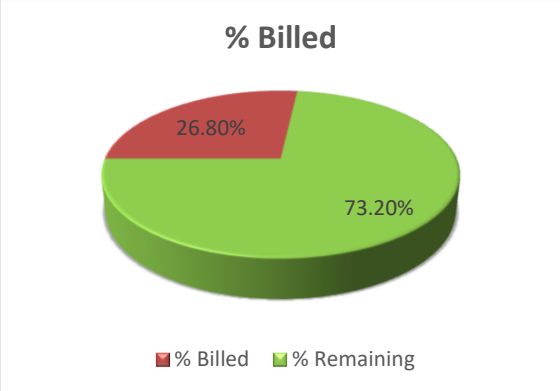
PCO #	COR #	Executed	Date	Total Used	Pending	Description
1	1	x	8/5/2020	$ (10,178.18)		PCO 001 - Increased the Competition pool
1	2	x	8/22/2020	$ (2,573.59)		PCO 002 - Increse size of Play Structure
2	3	x	9/29/2020	$ (74,421.00)		Bid Package #2
2	4	x	9/29/2020	$ (1,718.00)		Alternate #2 - Mill & Overlay parking lot
2	5	x	9/29/2020	$ (2,455.00)		Alternate #6 - Breezeway - Open structure with shade
2	6	x	9/29/2020	$ (127.00)		Alternate #11 - Storefront windows
Baseline Set at $317,438.65						
Contingency Use starts below						
	10	x	10/21/2020	$ 40,000.00		COR #010 Pool Scope Buyout
	11	x	10/21/2020	$ 5,238.09		COR #011 Quick Fill lines
					$815.00	Change ceiling in bathhouse to densglass
			TOTAL	$ 45,238.09	$ 815.00
